



ПРОЕКТ «



Суть проекта, описание в 3-х словах

ЗАО «ИМЯРЕК»

Докладчик:

Иннован Маркетингович Дерзкий,
руководитель проекта



СОДЕРЖАНИЕ

1. Концепция Проекта.
2. Сроки Проекта.
3. Ресурсы Проекта.
4. Необходимые оборудование и персонал.
5. Финансовый прогноз Проекта.
6. Проектная группа.
7. Схема реализации Проекта.
8. Предлагаемая мотивация по Проекту.
9. Анализ рисков проекта.
10. Выводы.

слайд 3

слайд 4

слайд 5

слайд 6

слайд 7

слайд 8

слайд 9

слайд 10

слайд 11

слайд 12





КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА


1. **Цель Проекта.**
2. **Плановый результат Проекта** – достижение которого означает выполнение Проекта (Продукты Проекта).
3. **Объем работ.**
4. Необходимость **привлечения внешних подрядчиков** и консультантов (указать цели привлечения).
5. Критерии Проекта – **измеримые критерии успешности Проекта** (сроки, стоимость, количество и качество продукции, стандарты качества и т.п.).
6. **Границы и рамки Проекта** (территориальные, отраслевые, технологические, организационные, стоимостные, качественные, временные, и т.д.).





СРОКИ ПРОЕКТА

1. Сроки завершения.
2. Контрольные точки.
3. Укрупненный план работ по Проекту, с указанием основных этапов.

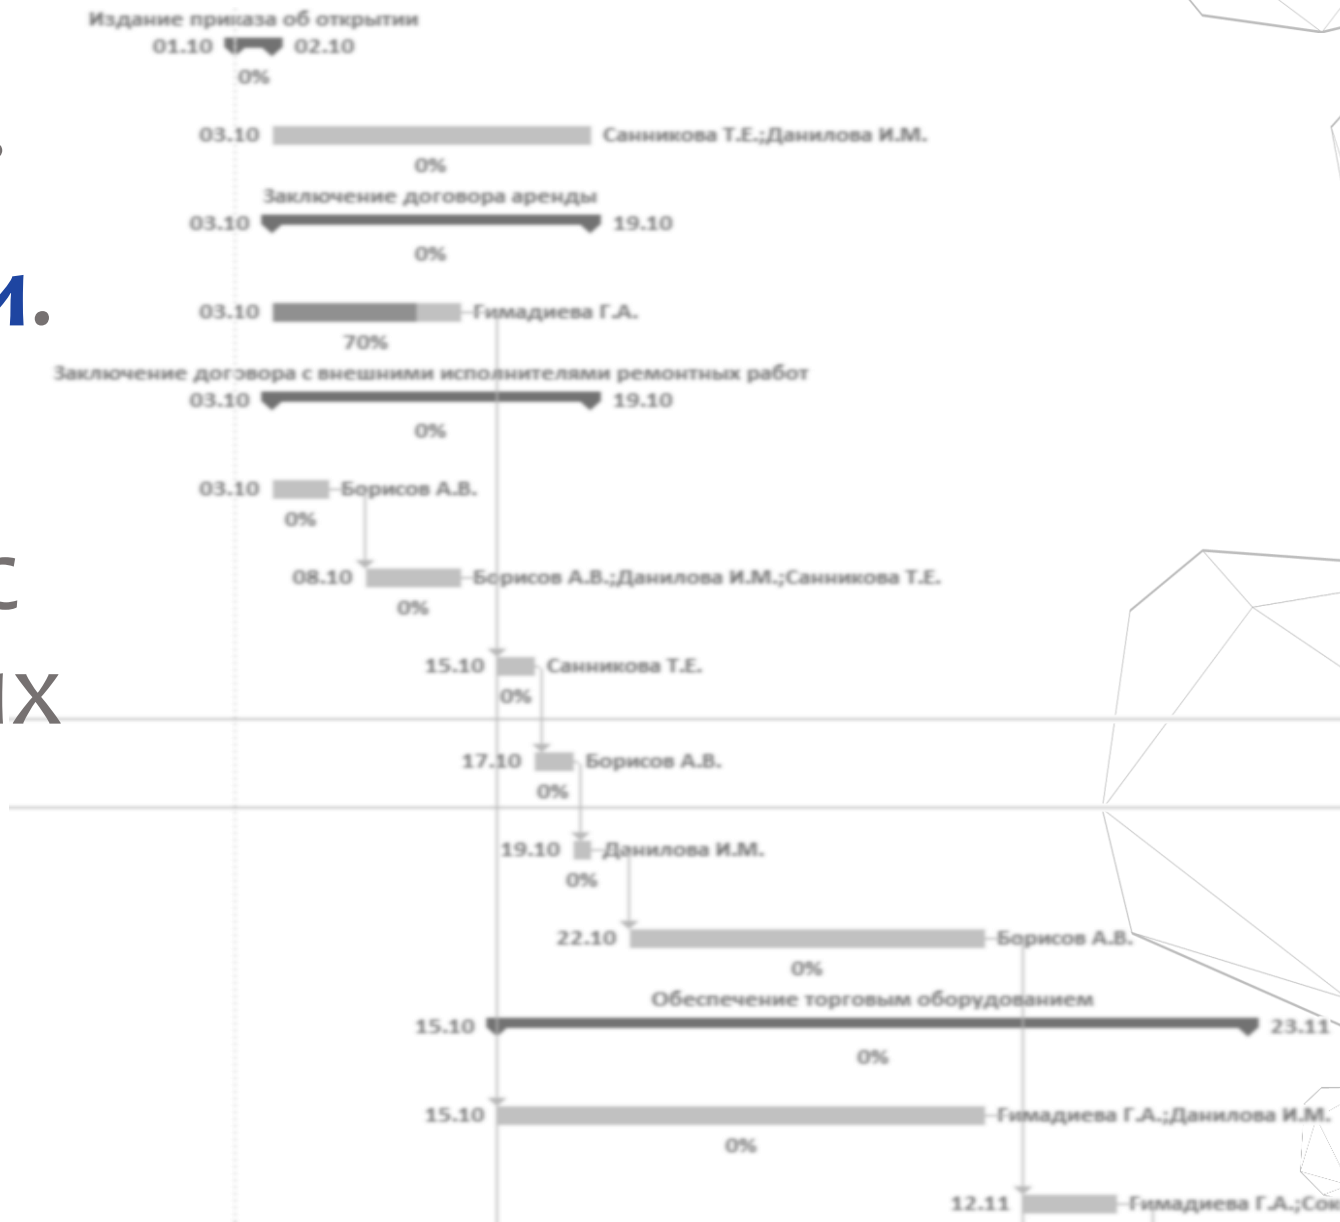




РЕСУРСЫ ПРОЕКТА




ФИНАНСОВЫЕ:

- Всего
- В т.ч.
- Источники



МАТЕРИАЛЬНЫЕ:

- Всего
- В т.ч.
- Источники

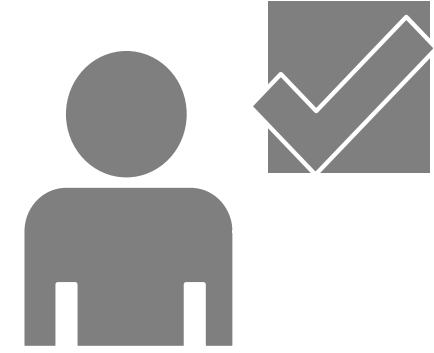


ТРУДОВЫЕ:

- Всего





ОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРСОНАЛ

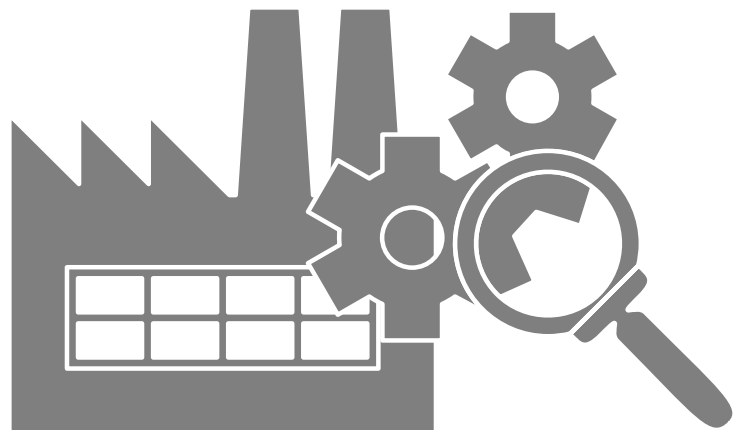

Перечень оборудования

Модуль 1: _____ Стоим-ть: _____
Модуль 2: _____ Стоим-ть: _____
Модуль 3: _____ Стоим-ть: _____
Модуль 4: _____ Стоим-ть: _____
ВСЕГО: _____


Персонал

Отдел 1: _____ Квалиф. _____ З/п: _____
Отдел 2: _____ Квалиф. _____ З/п: _____
Отдел 3: _____ Квалиф. _____ З/п: _____
Отдел 4: _____ Квалиф. _____ З/п: _____
ВСЕГО: _____ З/п: _____

◆ ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ ПРОЕКТА



**ПРОГНОЗЫ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ**



СРОК ОКУПАЕМОСТИ



ПРОЕКТНАЯ ГРУППА

■ Проектный Комитет:

- Иванов И.И. (должность в Обществе),
- Петров П.П. (должность в Обществе),
- Сидоров С.С. (должность в Обществе).

■ Руководитель Проекта:

- Дерзкий И.М. (должность в Обществе).

■ Состав Рабочей группы Проекта:

- Соколов (должность в Обществе)
- (Зона ответственности в Проекте _____)
- Андреев (должность в Обществе)
- (Зона ответственности в Проекте _____)
- Тимофеев (должность в Обществе)
- (Зона ответственности в Проекте _____)



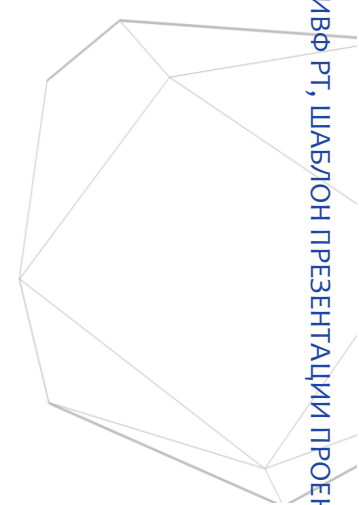


СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПРАВОВАЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

ФИНАНСОВАЯ



ИВФ РТ, ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА





МОТИВАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ



МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

- Фонд оплаты труда
- Премияльный фонд
- Корпоративные награды
- Абонементы в фитнес и т.п.

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

- Корпоративные награды
- Грамоты
- Благодарственные письма
- Поощрения
- Номинации в корпоративных конкурсах





АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА



РИСКИ	ОПИСАНИЕ	МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	РЕСУРСЫ
РЫНОЧНЫЕ	1. 2.			
ОПЕРАЦИОННЫЕ/ КОММЕРЧЕСКИЕ	1. 2.			
ТЕХНИЧЕСКИЕ				
КАДРОВЫЕ				
ФИНАНСОВЫЕ				
НАЛОГОВЫЕ				
ПРАВОВЫЕ				
ПРОЧИЕ				



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



Начальный уровень

Ключевые партнёры

Ключевые работы

Ценностное предложение

Отношения с клиентами

Клиентские сегменты


Описание ключевых функций, несущих основную ценность Продукта для выбранных сегментов целевой аудитории

Ключевые ресурсы

Каналы поставок

Структура затрат

Источники доходов





БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Корпоративный уровень





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ИВФ РТ, ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
